SEPTEMBER

TUKWILA PUBLIC SAFETY PLAN FACILITIES PLAN

Project Schedule

	Start	Finish	% Done
CITY/SOJ KICK-OFF MTG	10/05/16	10/05/16	100%
CITY VOTE	11/08/16	10/31/19	100%
BOND SALE	12/01/16	12/31/16	100%
PUBLIC OUTREACH - SITE SELECTON	01/01/17	12/31/21	27%
JUSTICE CENTER	02/06/17	05/25/20	7%
STATION 51	02/24/17	09/27/19	13%
STATION 52	02/20/17	06/05/20	12%
STATION 54	02/20/17	06/05/20	12%
CITY SHOPS	02/20/17	04/09/21	5%

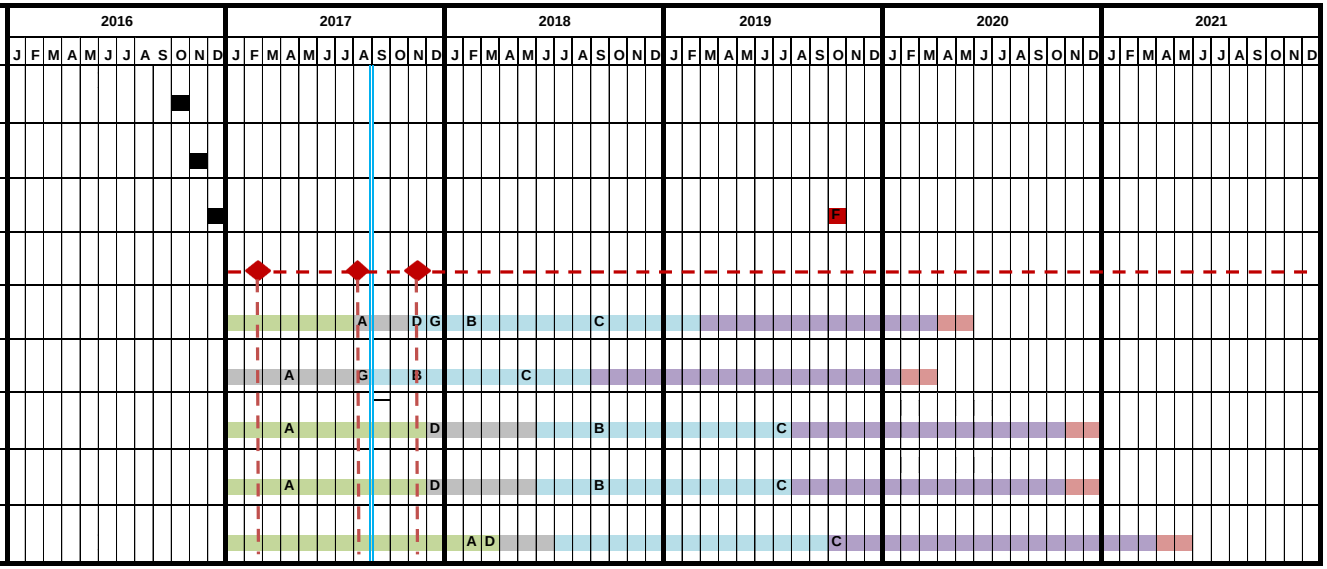

site selection
program/site selection
design and permitting
bidding and construction
move-in/occupancy

completed
public outreach

COUNCILMEMBER DECISIONS

(A)	Architect Contract Approval	**(D)**	Site Selection	**(G)**	GC/CM CPARB
(B)	Contractor Pre-Con Contract	**(E)**	Project Budget Changes		
(C)	Contractor Construction Approval	**(F)**	Bond Sale #2		
